

Presupuesto vigente 2026

\$13,69 M

63 líneas registradas · 51 con presupuesto asignado · 44 plataformas

Plan 67,3 %

62,0 % ejecutado del año

5,3 pp detrás del plan

Solicitado
\$13,84 M


Aprobado
\$13,24 M

Recorte en aprobación
-\$596,7 K · -4,3 %

Ejecutado a agosto

\$8,49 M

de \$9,21 M planificado al mes



Cumplimiento del plan 92,2 %

Desviación acumulada

\$720,8 K

sub-ejecución frente al plan a agosto



5,3 % del presupuesto vigente

Cierre proyectado

\$12,63 M

92,3 % del presupuesto vigente



Holgura de \$1,06 M


Dinámica mensual

■ Presupuesto — Ejecución real - - - Proyectada



Junio concentra el mayor desembolso del año por liquidaciones semestrales. Julio incluye la salida de Cisco SmartNet (~\$300,2 K) hacia las nuevas líneas del EA de Cisco, y mayo refleja reasignaciones internas.

Estado de las líneas

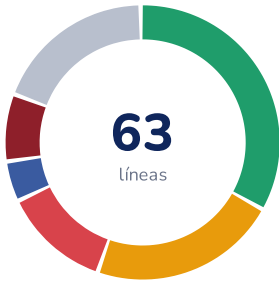

En línea	21
Sub-ejecutada	14
Sobre-ejecutada	8
Pago en Q4	3
No se ejecutará	5
Sin presupuesto propio	12

Según cumplimiento del plan a agosto: en línea 95–102 %, sub-ejecutada bajo 95 %, sobre-ejecutada sobre 102 %.

Lo que muestran los datos

69 %

de la sub-ejecución a agosto se concentra en Microsoft E5, WSO2 y Bravco.

+6 %

de sobrecosto recurrente por impuestos no recuperables en contratos con el exterior.

68 %

del presupuesto vigente está en 10 de 44 plataformas.

0 de 39

subcategorías NIST de Gobernar y Recuperar tienen una plataforma asociada.

Portafolio por plataforma

Presupuesto, ejecución y proyección consolidados por plataforma; las líneas presupuestarias de una misma plataforma se suman

Año fiscal 2026

Corte: agosto

USD

2 / 5


Plataforma y líneas	Vigente	Ejecutado ago.	Cumplimiento del plan	Cierre proy.	Holgura / exceso	Estado
Gestión plataformas (Bravco) TEC1192	\$1,54 M	\$924,7 K	92 %	\$1,44 M	+\$104,3 K	Sub-ejecutada
Microsoft E5 AMO0065	\$1,44 M	\$519,4 K	60 %	\$934,8 K	+\$503,4 K	Sub-ejecutada
SOC · Correlacionador (Splunk) TEC1113	\$1,10 M	\$743,8 K	100 %	\$1,12 M	-\$20,7 K	En línea
Biocatch TEC0855	\$1,02 M	\$689,0 K	100 %	\$1,03 M	-\$9,9 K	En línea
SOC · Optimizador (ORXLog) TEC1419	\$998,3 K	\$665,5 K	100 %	\$998,3 K	—	En línea
Crowdstrike TEC0772	\$724,0 K	\$505,9 K	100 %	\$758,9 K	-\$34,9 K	En línea
Firewall perimetral on-premise TEC0115, TEC1482	\$719,4 K	\$467,6 K	86 %	\$631,5 K	+\$87,9 K	Sub-ejecutada
Facephi TEC0648	\$691,0 K	\$460,7 K	100 %	\$691,0 K	—	En línea
Darktrace TEC1195	\$580,1 K	\$586,5 K	105 %	\$607,3 K	-\$27,2 K	Sobre-ejecutada
Cortex Cloud TEC0655	\$548,6 K	\$362,3 K	97 %	\$537,4 K	+\$11,2 K	En línea
Netskope TEC0770	\$502,2 K	\$336,2 K	100 %	\$503,6 K	-\$1,4 K	En línea
Cisco IPS TEC0610, TEC1817, TEC1818	\$437,8 K	\$318,8 K	103 %	\$452,8 K	-\$15,0 K	Sobre-ejecutada
Proofpoint TEC0771	\$425,1 K	\$238,4 K	101 %	\$397,2 K	+\$27,9 K	En línea
Octopus TEC1513	\$366,3 K	\$212,0 K	87 %	\$272,6 K	+\$93,7 K	Sub-ejecutada
Akamai WAF TEC0653	\$331,6 K	\$204,6 K	97 %	\$322,2 K	+\$9,3 K	En línea
Gestión de identidades (WSO2) TEC1119	\$288,8 K	\$126,8 K	57 %	\$126,8 K	+\$162,0 K	Sub-ejecutada
AntiDDoS Radware TEC0498	\$281,0 K	\$191,6 K	102 %	\$290,9 K	-\$9,8 K	Sobre-ejecutada
Resto de plataformas (27) Tenable, Cisco Stealthwatch, Kriptos, Trellix, Cisco ISE, Cyberark, Forcepoint DLP, DecisionCloud...	\$1,70 M	\$939,5 K	90 %	\$1,52 M	+\$179,3 K	
Total portafolio	\$13,69 M	\$8,49 M	92 %	\$12,63 M	+\$1,06 M	

Cumplimiento del plan = ejecutado acumulado ÷ presupuesto acumulado a agosto. La marca vertical señala el 100 %.

Concentración del gasto

14 de 44

plataformas explican el 80 % del presupuesto vigente



Las 5 mayores (Bravco, E5, Splunk, Biocatch y ORXLog) suman \$6,10 M: una variación del 5 % en ellas equivale a \$304,8 K.

Patrón de pago

Participación en el vigente según la regularidad de los desembolsos



Las líneas pagadas por hitos concentran la mayoría de desviaciones mensuales.


Líneas sin presupuesto propio (12)

Plataformas operadas por el grupo cuyo costo se registra en otra parte

Incluidas en E5 Defender for Cloud Apps, Intune MAM, M365 Defender	Pagadas por el negocio Sentinel Prevention, Detect ID
Arquitectura SNOW (SIR, TIP y certificados)	No requieren Entidad certificadora interna, Spartan
Sin asignación DLS5, 360 Brand Guardian, Snyk/StackHawk	Reasignada Cisco SmartNet → EA de Cisco

Holgura o exceso proyectado por plataforma

HolguraExceso

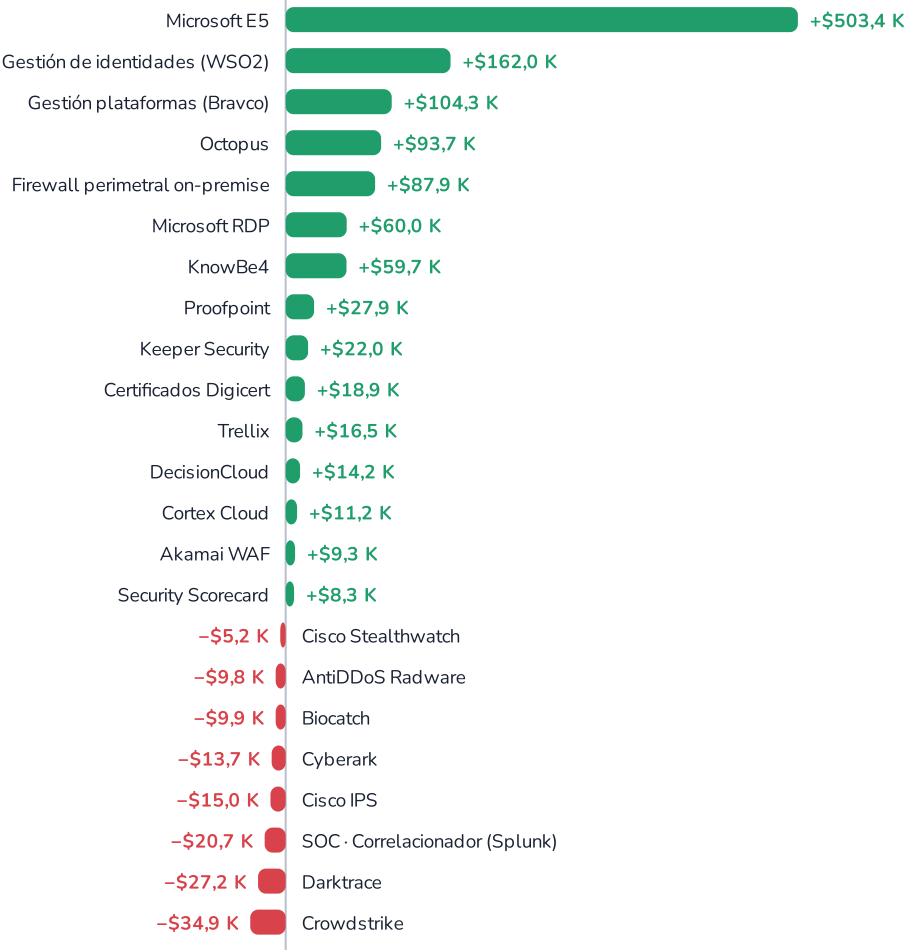

Plataformas con variación mayor a \$5 K. Holguras brutas de \$1,21 M y excesos de - \$145,2 K en 11 plataformas; neto \$1,06 M.

Del solicitado al cierre proyectado

Eje truncado desde \$11,5 M para resaltar las variaciones



Fondos potencialmente liberables

Holgura proyectada con causa identificada en las notas del presupuesto

Microsoft E5	\$503,4 K
Sub-ejecución estructural; amortización de enero no registrada	
Gestión de identidades (WSO2)	\$162,0 K
Acumulado desde marzo; pago aún pendiente	
Gestión plataformas (Bravco)	\$104,3 K
Salida de plataformas del contrato de administración	
Octopus	\$93,7 K
Pagos por hitos por debajo del plan	
Firewall perimetral on-premise	\$87,9 K
Servidores retirados; sin ejecución en jul-ago	
Microsoft RDP	\$60,0 K
Sin ejecución registrada en el año	
KnowBe4	\$59,7 K
No renovado; se reasigna a servicios IAM	
Keeper Security	\$22,0 K
No se renueva; reasignación probable al EA de Cisco	
Total identificado	\$1,09 M

Mayores recortes en la aprobación (solicitado frente a aprobado)

Firewall perimetral on-premise

- \$265,5 K

Akamai WAF

- \$62,0 K

Cisco SmartNet

- \$49,9 K

Cisco IPS

- \$43,6 K

Crowdstrike

- \$38,1 K

SOC · Correlacionador (Splunk)

- \$30,0 K

Presupuesto por función NIST y cobertura de subcategorías


Base mapeada: \$12,09 M, 88 % del vigente



Proteger 44 % Detectar 44 % Responder 7 % Identificar 5 %

Presupuesto por capacidad de ciberseguridad

Ponderado según el aporte de cada plataforma a cada capacidad

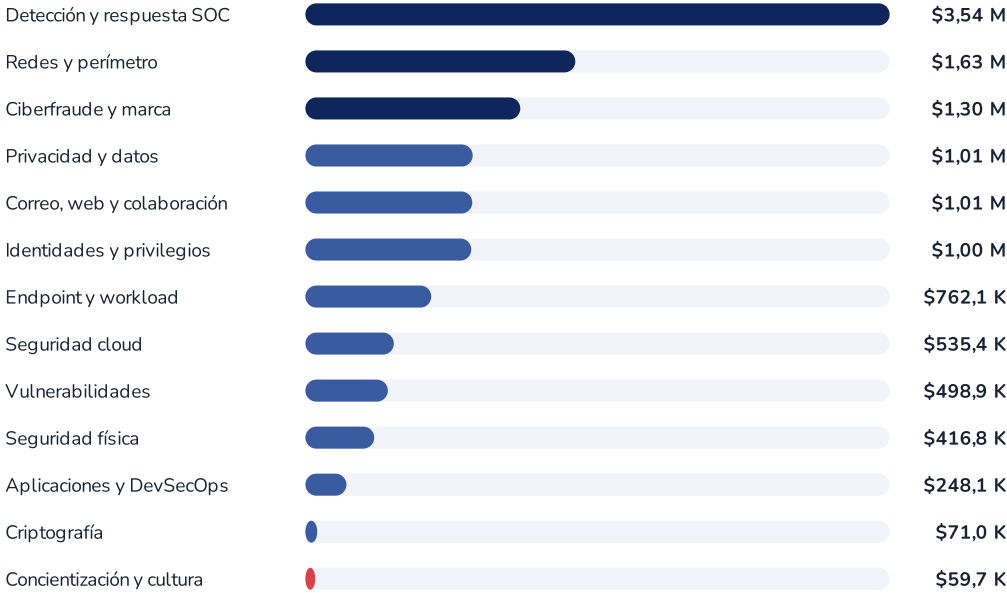

Hallazgos de cobertura

- Brecha

Gobernar (0/31) y Recuperar (0/8) no tienen plataformas asociadas. Es esperable en Gobernar, que se resuelve con procesos; Recuperar, en cambio, carece de soporte tecnológico medible.
- Riesgo

Concientización depende solo de KnowBe4 (\$59,7 K), que no se renovó. PR.AT-01 y PR.AT-02 quedarían sin cobertura si no se reemplaza.
- Superposición

DE.AE-02 (análisis de eventos adversos) está cubierta por 15 plataformas y DE.CM-09 por 12: oportunidad de racionalizar herramientas.
- Dependencia

9 subcategorías dependen de una única plataforma; por ejemplo, PR.IR-03 (resiliencia) solo de AntiDDoS Radware.
- Balance

El 88 % del gasto mapeado va a Proteger y Detectar; Responder recibe 7 % e Identificar 5 %.

Subcategorías con más plataformas superpuestas

DE.AE-02	Eventos potencialmente adversos analizados para comprender mejor la actividad asociada	15
DE.CM-09	Hardware y software de cómputo, entornos de ejecución y sus datos monitoreados para hallar evento...	12
DE.CM-02	El entorno físico es monitoreado para hallar eventos potencialmente adversos	10
PR.AA-05	Permisos y autorizaciones definidos en política, gestionados, exigidos y revisados, con mínimo privilegi...	10
RS.MI-01	Los incidentes son contenidos	10

Sub-ejecución concentrada

\$532,1 K

E5, WSO2 y Bravco explican el 69 % de lo sub-ejecutado a agosto; el resto del portafolio opera cerca del plan.

Recortes sin ajuste contractual

−\$65,4 K

Crowdstrike, Splunk y Biocatch recortan su presupuesto en nov–dic, pero la cuota del contrato se mantiene y genera exceso.

Impuesto no recuperable

+6 %

Las líneas nuevas del EA de Cisco, Radware y Kriptos ejecutan sobre lo planificado por ISD; en Cisco suma \$24,0 K adicionales.

Consolidación del EA de Cisco

−\$300,2 K

SmartNet y saldos de Bravco, Proofpoint y Keeper migran a TEC1817/1818; TEC0610 se ejecuta hasta octubre.

Renovaciones al cierre

\$183,5 K

Trellix, NXLog y Deep Security se pagan en nov–dic. Cyberark renueva en noviembre sin presupuesto.


Licencias no renovadas

\$81,7 K

KnowBe4 y Keeper no se ejecutarán: el saldo se reasigna, pero la concientización queda sin plataforma.

Hitos del último cuatrimestre

Ejecución proyectada frente al presupuesto mensual · E5 y WSO2 dejan un saldo recurrente de \$54,2 K al mes



Acciones recomendadas

Acción	Impacto	Plazo
Regularizar con Finanzas la amortización de E5 y confirmar su monto real de cierre	Hasta \$503,4 K	Septiembre
Ejecutar o liberar formalmente el saldo de WSO2 acumulado desde marzo	\$162,0 K	Septiembre
Alinear los recortes de nov–dic con los proveedores (Crowdstrike, Splunk, Biocatch) o revertirlos	\$65,4 K	Octubre
Definir el reemplazo de KnowBe4 para mantener cubiertas PR.AT-01 y PR.AT-02	Cobertura NIST	Octubre
Reservar caja para Trellix, NXLog y Deep Security, y cubrir la renovación de Cyberark	\$197,2 K	Octubre
Presupuestar ISD e impuestos no recuperables (≈ 6 %) en contratos con proveedores del exterior	≈ 6 % por contrato	Plan 2027

Metodología y supuestos

Vigente = “presupuesto calculado”: incluye reasignaciones y las líneas nuevas del EA de Cisco (\$451,6 K sobre el aprobado). Ejecución real ene–ago; sep–dic proyectada por el área.

Estado por cumplimiento del plan a agosto: en línea 95–102 %, sub-ejecutada bajo 95 %, sobre-ejecutada sobre 102 %.

Mapeo NIST: vigente x % de aporte por función y capacidad. E5 usa el perfil promedio de sus tres componentes de seguridad; Bravco, RDP, VideoWall y Catálogo IPs (\$1,61 M) no se mapean por ser transversales.

Calidad del dato: 12 líneas sin presupuesto propio o “SIN DATO”; E5 no registra la amortización de enero.
